



## RELATÓRIO EMERGENCIAL GEFIS Nº 62 /2014

Assunto: Andamento das obras da macro adutora de água tratada Itacorubi - Florianópolis

---

### 1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

---

### 2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

Endereço: Rua Emilio Blum, 83 – Centro - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 32215000

CNPJ: 82.508.433/0001-17

Site: [www.casan.com.br](http://www.casan.com.br)

---

### 3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização Emergencial

Unidade Auditada: Sistema de Abastecimento de Água Integrado

Município: Florianópolis/SC

Data da Inspeção: 31 / 10 / 2014.

---

### 4 JUSTIFICATIVA

Esta visita foi agendada para acompanhar o andamento e a conclusão das obras da macro adutora de água tratada Itacorubi para melhorar o abastecimento de água na região Norte do município.

---

### 5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação da visita técnica compreendeu os procedimentos de esclarecimento, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, através de dados primários e dados secundários.

## 5.1 Locais Visitados

Data	Nº	LOCAL VISITADO
31/10/2014 – Itacorubi	01	Obra visitada na localidade da SC 401 (Avenida da Saudade)

### 5.1.1 Macro adutora de água tratada do Itacorubi

A Concessionária está realizando obras de ampliação da rede de distribuição de água tratada na localidade do Itacorubi. Estas obras têm por intuito reforçar a vazão de água disponibilizada para a região Norte do município de Florianópolis, devido à grande demanda de água na temporada de verão.

Essas obras possuem as seguintes características de tubulação (Fonte: CASAN):

- 1.368 metros de tubulação de ferro fundido dúctil com diâmetro de 700 milímetros do CIC até o bairro João Paulo;
- 261 metros de tubulação de ferro fundido dúctil com diâmetro de 500 milímetros + 1.961 metros de tubulação de ferro fundido dúctil com diâmetro de 400 milímetros do CIC até o bairro Santa Mônica (Shopping Iguatemi).

No dia da vistoria, grande parte das obras estava concluída (sublinhado em laranja na Figura 1), restando 6 pontos a serem finalizados (circulado em vermelho na Figura 1):

- Trecho em frente ao Shopping Iguatemi (Avenida Beira Mar Norte);
- Trecho que atravessa a Avenida Beira Mar Norte do CIC até o mangue;
- Trechos das duas pontes da Avenida da Saudade;
- Trecho de 100 metros em frente ao SOS Córdio;
- Trecho entre o viaduto do João Paulo e o Booster Tecnópolis – necessita atravessar a SC 401.

Atualmente as obras estão concentradas no trecho de 100 metros em frente ao SOS Córdio (Figuras 2).

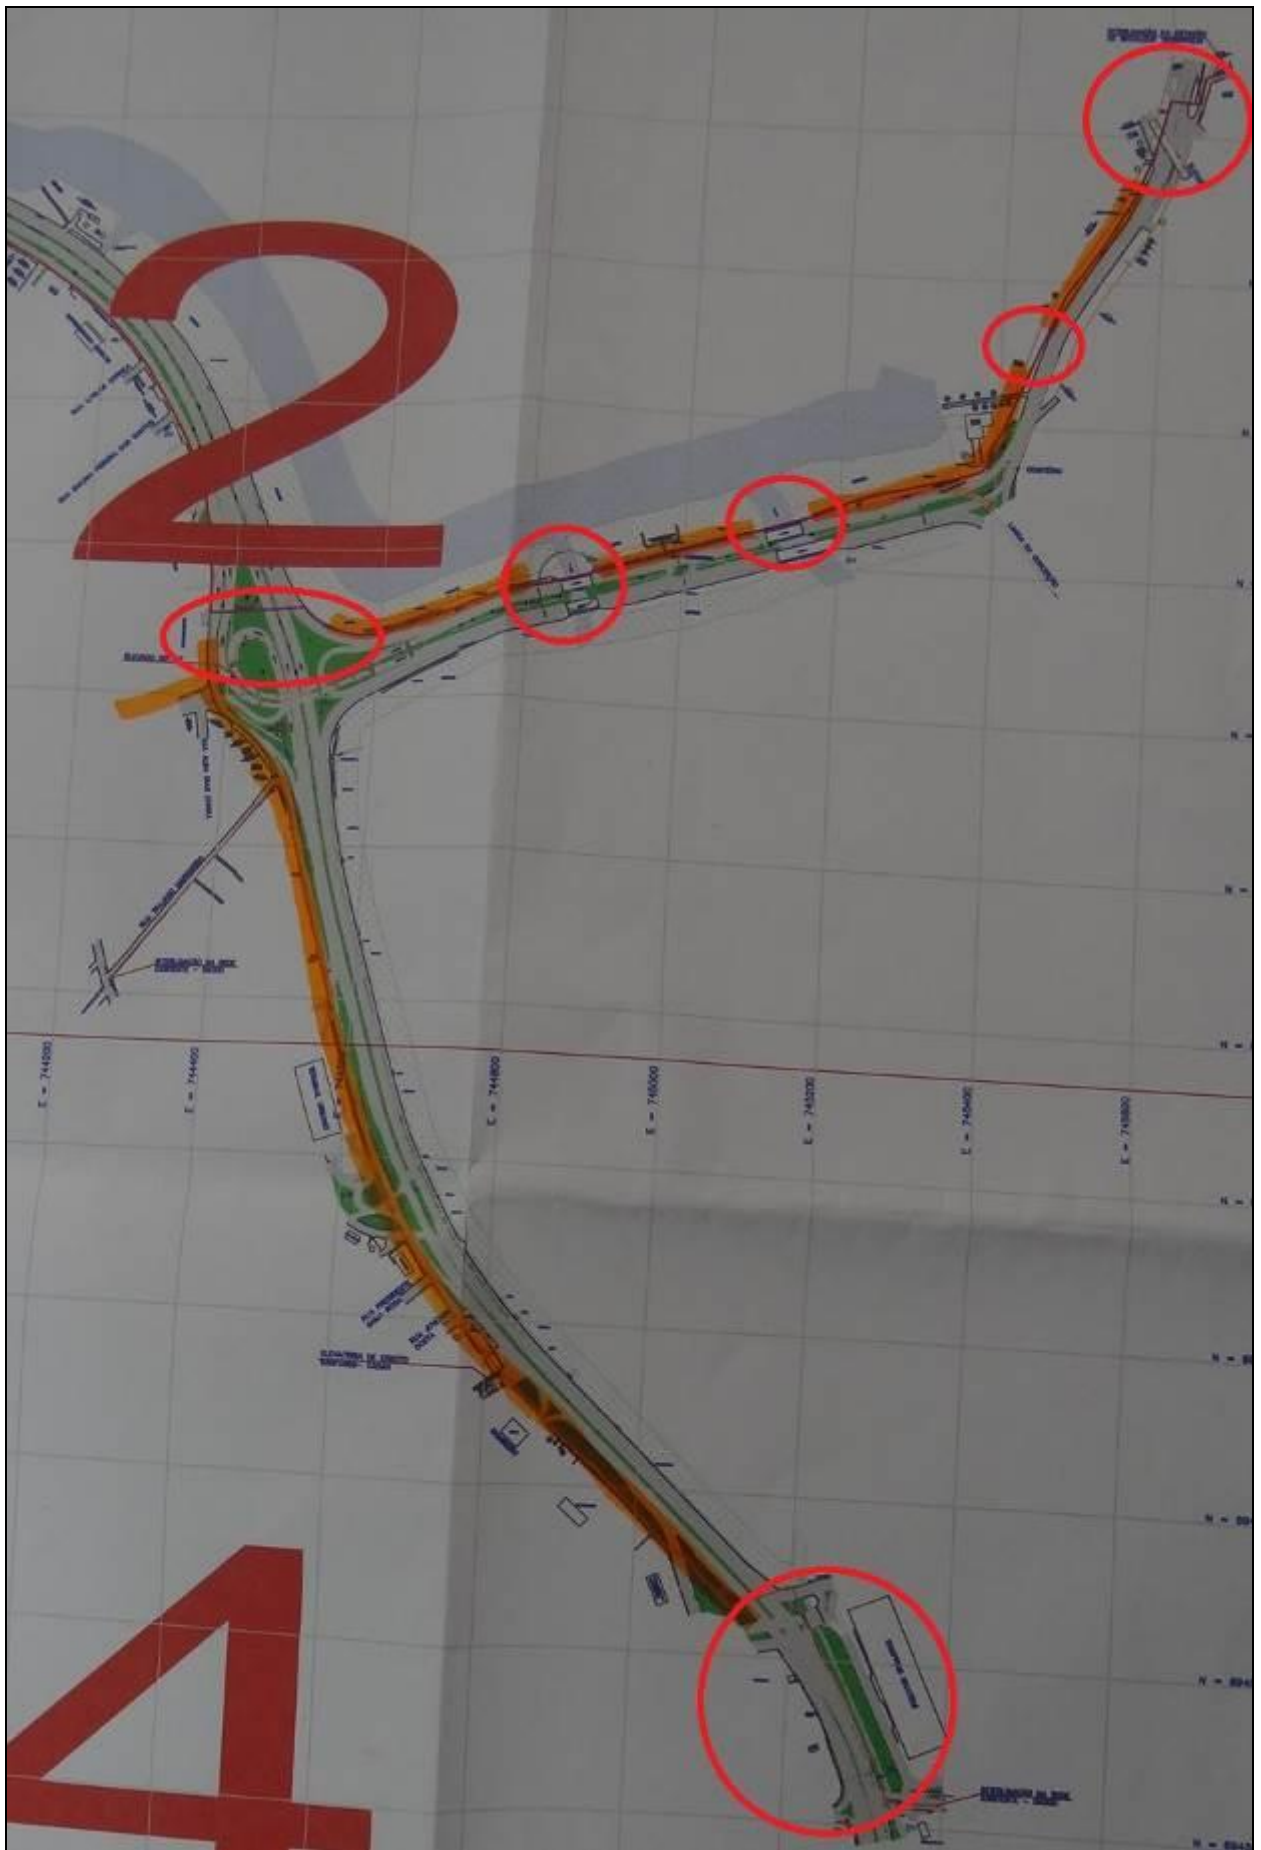


Figura 1: Localidade em obras



**Figura 2: Trecho com obras em andamento – SOS Cárdio**

Com essa nova macro adutora, a região Norte do município contará com mais 60 L/s de água tratada para melhorar o abastecimento, principalmente na temporada de verão onde o número de consumidores aumenta significativamente. A conclusão destas obras está prevista para o dia 15 de dezembro de 2014.

No ano de 2016, as obras de ampliação da rede de distribuição para a região Norte do município estarão concentradas ao longo da Avenida Beira Mar Norte.

## **6 CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Essa obra vistoriada faz parte de todo um sistema de melhorias que a Concessionária está investindo para melhorar o abastecimento de água da Capital. Além dessa macro adutora, obras na Estação de Tratamento de Água Morro dos Quadros estão em andamento para aumentar a vazão de água tratada e; no ano de 2016, será feita uma adutora da Ponte Pedro Ivo até o CIC (na Avenida Beira Mar).

A AGESAN estará acompanhando o término das obras que está previsto para o dia 15 de dezembro de 2014.



**Figura 3: AGESAN e CASAN na visita**

---

**7 EQUIPE TÉCNICA**

---

Francisco Carlos Portella  
Analista Técnico em Promoção Saúde

---

João Luiz Junkes Coelho  
Analista Técnico em Gestão de DS

---

Eng. Luíza Kaschny Borges  
Gerente de Fiscalização

---

**RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO**  
**DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN**

---

Eng. Sílvio César dos Santos Rosa  
Diretor de Regulação e Fiscalização

---

Sérgio José Grandó  
Diretor Geral

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-
