



RELATÓRIO EVENTUAL.EMERGENCIAL GEFIS Nº 041/2014

Assunto: Fiscalização obras ETA São Miguel/Biguaçu

Referência: Processo 0297/2014

1 IDENTIFICAÇÃO DA AGESAN

Nome: AGESAN - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina.

2 IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: CASAN

Endereço: Biguaçu/SC

Telefone: (48) 3221-5202

CNPJ: 82.508.433/0024-03

Site: www.casan.com.br

3 CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Auditoria: Fiscalização

Unidade Auditada: ETA São Miguel/Biguaçu

Data da Inspeção: 09 e 30 / 05 / 2014.

4 JUSTIFICATIVA

Esta visita foi agendada para acompanhar fiscalizar as obras de instalação da nova ETA.

5 METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da Ação da visita técnica compreendeu os procedimentos de esclarecimento, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema com auxílio de fotografias, através de dados primários e dados secundários.

A visita foi feita junto a Estação de Tratamento de Água – ETA no município de Biguaçu, na localidade de São Miguel.

5.1 Locais Visitados

ITEM	Nº	LOCAL VISITADO
Biguaçu	01	São Miguel - ETA
Biguaçu	02	São Miguel - Hidrômetros

5.1.1 ETA.



Figura 1: ETA - Quadro de Comando (09/05/2014)



Figura 2: Entrada da Água e Decantadores (09/05/2014)



Figura 3: Floculadores e Produtos Químicos (09/05/2014)



Figura 4: Vista geral da ETA (30/05/2014)



Figura 5: Entrada de água e decantadores (30/05/2014)



Figura 6: Futuros reservatórios (30/05/214)

5.1.2 Instalação dos hidrômetros



Figura 7: Setor 200: Rua Bento Francisco – hidrômetros dentro dos terrenos dos proprietários (30/05/2014)



Figura 8: Setor 202: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes – modelo padrão de hidrômetro (30/05/2014)

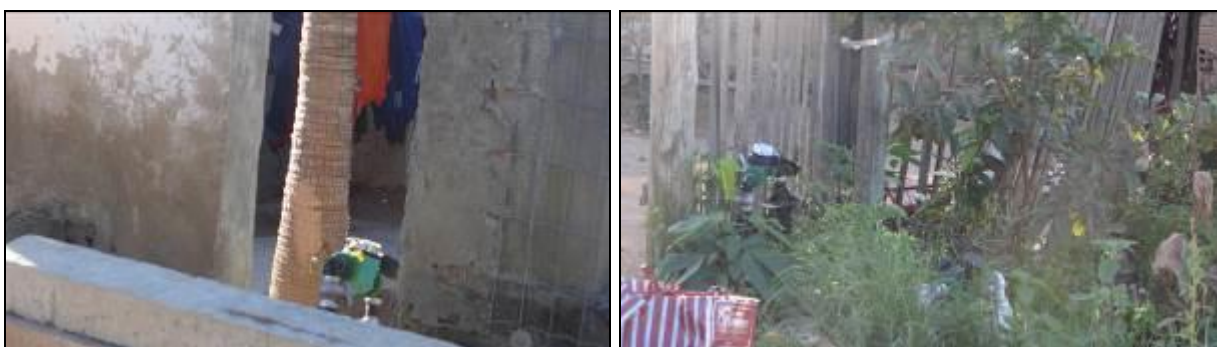


Figura 9: Setor 209: Rua José Nascimento Reis – sem modelo padrão de instalação de hidrômetro (30/05/2014)



Figura 10: Setor 213: Rua João Benedito da Luz – modelo padrão de hidrômetro (30/05/2014)

6 CONSIDERAÇÕES

As duas visitas foram consideradas positivas, pois a equipe constatou que a nova instalação da ETA está operando normalmente, faltando somente o acabamento do entorno da mesma, e a reforma dos futuros reservatórios.

Em relação à instalação dos hidrômetros nos 16 setores da região de São Miguel, foi constatado que, na maioria das residências, os moradores não aceitaram a instalação do modelo padrão de hidrômetro. Assim, eles foram colocados dentro dos terrenos dos proprietários, dificultando a leitura pelos funcionários da concessionária. Restam ainda cerca de 80 residências que não possuem hidrômetro, pois os moradores foram contra a instalação. Eles receberão uma notificação para regularizar a situação.

Nossa equipe também se prontificou e se colocou a disposição para contribuir com outras demandas que se fizerem necessárias do município.

7 EQUIPE TÉCNICA

Jatyr Fritsch Borges - Gerente
GEO MSc Análise e Gestão Ambiental

João Luiz Junkes Coelho – Membro
Analista Técnico em Gestão de DS

Luíza Kaschny Borges
Engenheira Ambiental

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DREF/AGESAN

Sílvio César dos Santos Rosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Sérgio José Grandó
Diretor Geral
